


善福寺川上流地下調節池工事の来週の作業予定

日頃より、東京都の河川整備事業にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
都では、近年激甚化する豪雨による浸水から、皆様の命と暮らしを守るため、「善福寺川上流地下調節池」の整備を進めております。
来週は、下表のスケジュールで作業を進めてまいります。
※天候や進捗により日程や工事車両が変更となる場合がございます。

施工場所	作業内容	今週							来週(予定)						
		8/30 日	8/31 月	9/1 火	9/2 水	9/3 木	9/4 金	9/5 土	9/6 日	9/7 月	9/8 火	9/9 水	9/10 木	9/11 金	9/12 土
①	環境調査工		現地測量・粉じん調査・粉じん計測用仮設電気配線							現地測量・粉じん調査・粉じん計測用仮設電気配線					
②	仮囲い工		仮設フェンス設置・撤去							仮設フェンス設置・撤去					
③	樹木処理工 (善福寺川南側)		土壌調査・剪定・伐採							土壌調査・剪定・伐採・移植前準備					
④	公園施設撤去移設工 (善福寺川南側)		防災施設移設、街路灯撤去							防災施設移設、街路灯撤去					
⑤	ヤード整備工		善福寺川南側敷鉄板設置									善福寺川北側敷鉄板撤去			
			未開園地試掘・測量等							未開園地試掘・測量等					
主要工事車両	※1 早朝(～6時)													60tク×1台	
	屋間 (8:30～17:00)	4tト×5台 2tダ×3台 4tダ×5台	4tト×5台 2tダ×3台 4tダ×6台 15tト×1台	4tト×5台 2tダ×3台 4tダ×6台 15tト×1台	4tト×5台 2tダ×3台 4tダ×6台 15tト×1台	4tト×5台 2tダ×3台 4tダ×6台 15tト×2台			4tト×3台 2tダ×3台 4tダ×6台	4tト×5台 2tダ×3台 4tダ×6台 15tト×3台 10tダ×1台	4tト×5台 4tダ×3台 15tト×2台	4tト×5台 2tダ×3台 4tダ×3台 15tト×3台	4tト×5台 2tダ×3台 4tダ×3台 15tト×5台		
	※1 夜間(21時～)													60tク×1台	

工事車両の標記:ト⇒トラック、ク⇒クレーン、ダ⇒ダンプトラック、タ⇒タンク、トレ⇒トレーラー、高車⇒高所作業車
※1 特殊車両は、安全確保のため、昼間の時間帯を避けて通行いたします。

園路 通行規制 情報	善福寺川沿い 北側園路 重要①														
	善福寺川沿い 南側園路 重要②														

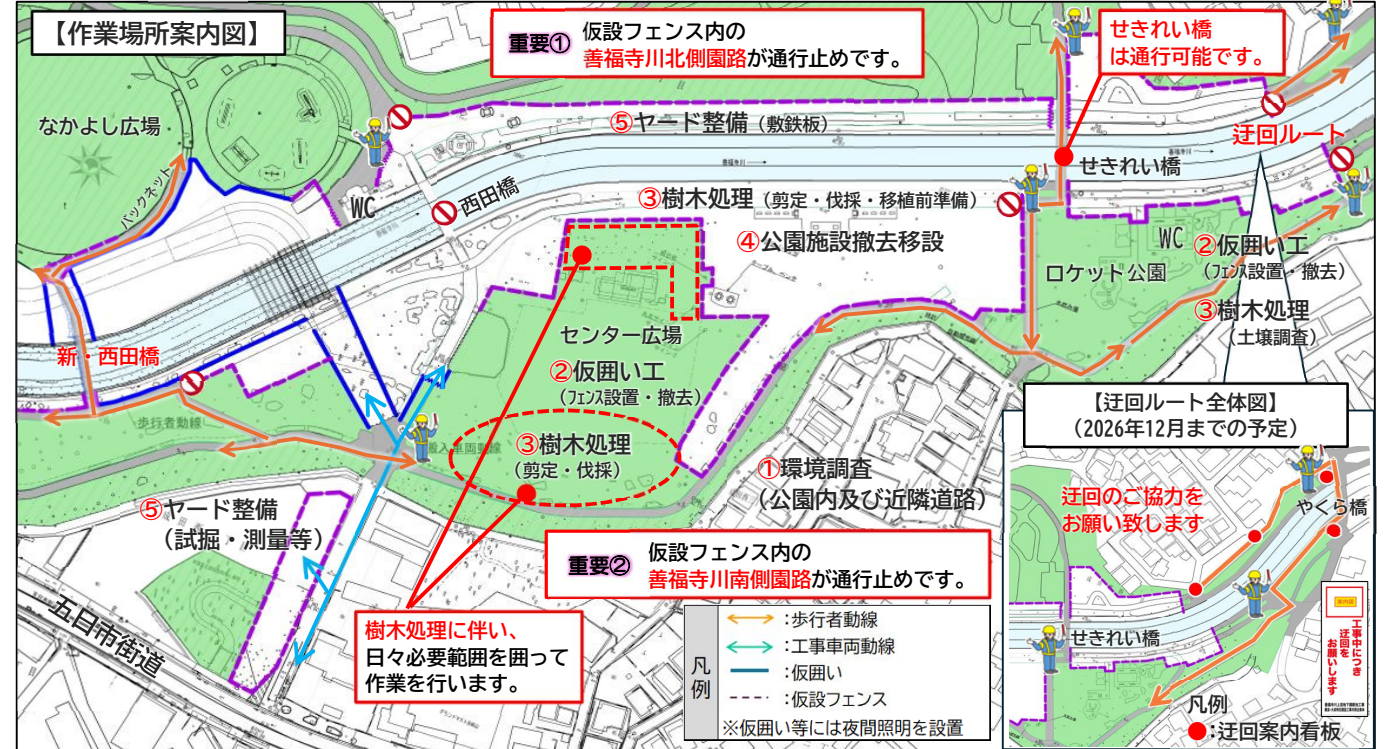

皆様にはご不便をお掛けしますが、安全を第一に施工してまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。毎週金曜日に翌週の工事予定をお伝えいたします。

善福寺川上流地下調節池工事の「ホームページ」を開設いたしました。工事の進捗状況やお知らせ事項を掲載してまいりますので、右記のQRコードよりご確認ください。



鹿島・大成特定建設工事共同企業体
善福寺川上流地下調節池JV工事事務所
☎080-1333-3690(平日9:00～17:00)
